



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



Vernieuwen asfalt Spijkenisserbrug

Deltalinqs

Peter-Bert van Herwijnen

27 maart 2024



Inhoud van de presentatie:

Deel I:

- Aanleiding voor dit werk
- Tussentijdse maatregelen

Deel II

- Toelichting op de werkzaamheden
- Maatregelen om de hinder te beperken

Gelegenheid voor het beantwoorden van vragen



Wat?

Grote verkeershinder

13 april - 13 mei

Vernieuwen asfalt
Spijkenisserbrug






Waarom?

- Inspecties
- Grote onderhoudsopgave RWS breed
- Oprichten nieuw team

Advies:


- Herstel het asfalt op de hefdelen
- Doe dit met spoed
- Zonder verkeer

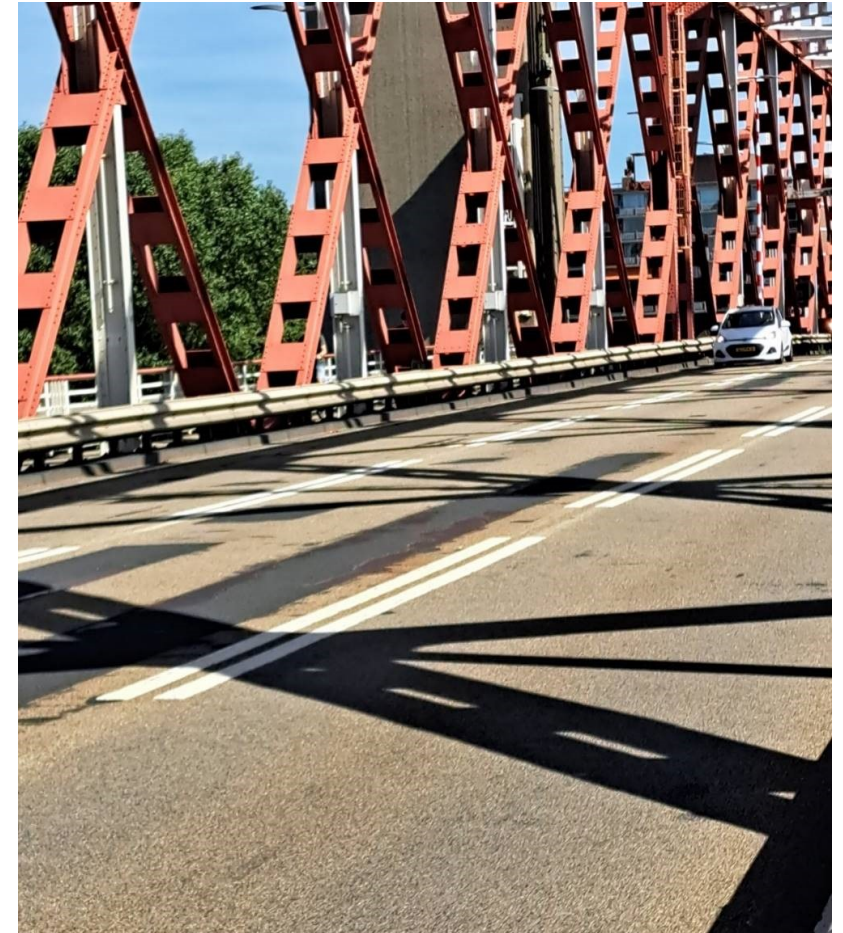



Hoe?

- Slijtlaag vervangen
- Onderliggende stalen rijdek inspecteren en herstellen
- Voegovergangen renoveren en voegen aanpassen

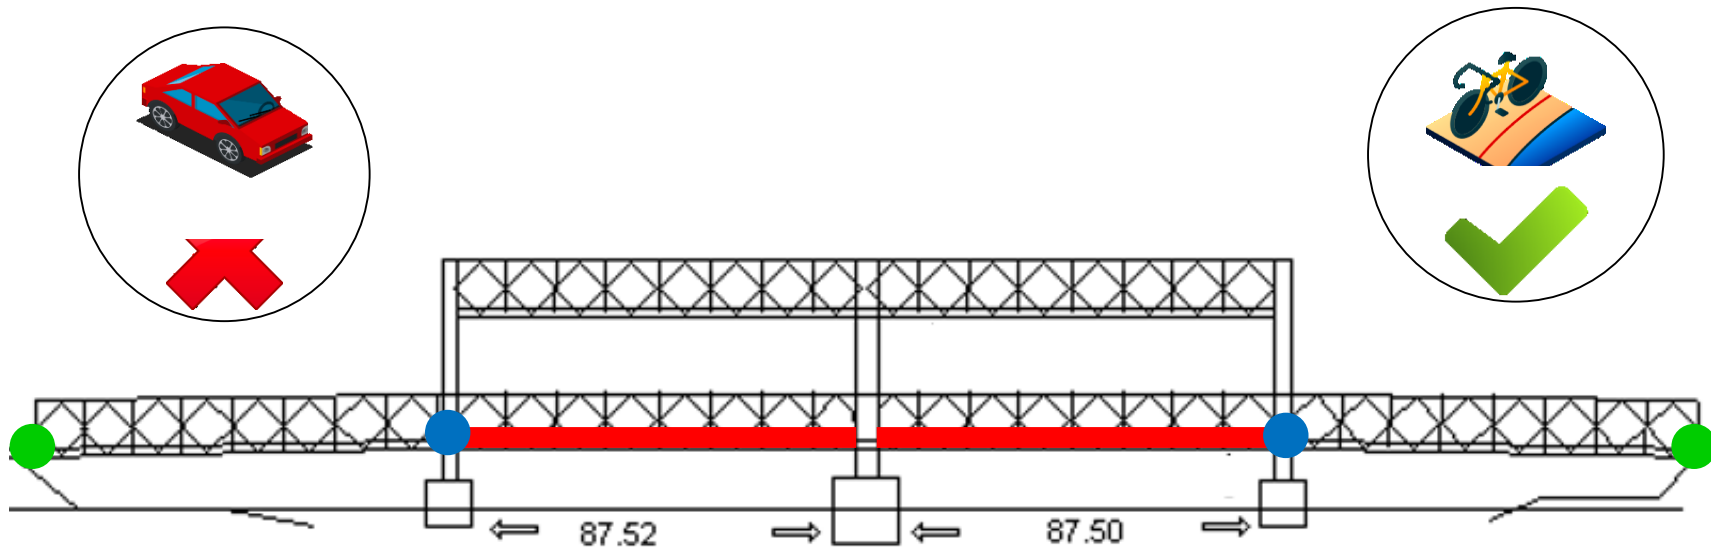




Conditie?

- Warmer dan 10 graden
- Trillingsvrij
- Zonder regen
- Niet tijdens grote renovatie 2024-2025

- Uitvoering zaterdagavond 13 april t/m maandagavond 13 mei
- Gebruikmakend van meivakantie

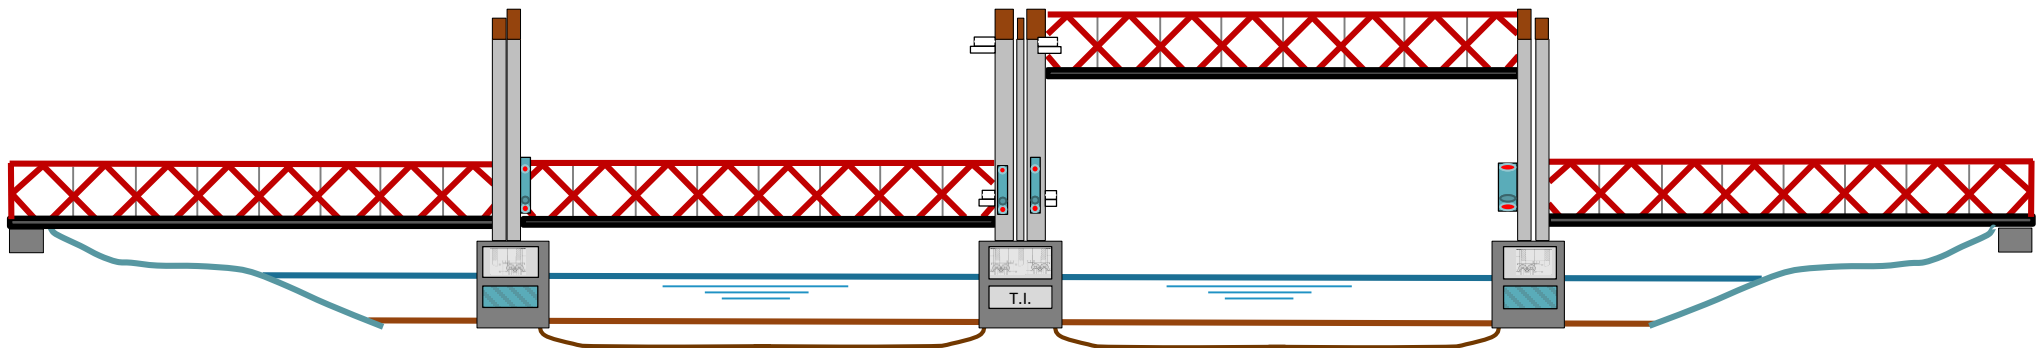



Toelichting werkzaamheden

Waarom 4 weken afsluiten?

1. Plaatsen van verkeersmaatregelen
2. Verwijderen geleiderail
3. Verwijderen slijtlaag (**geluidhinder**)
4. Opbouw werktent
5. Onderzoek en lassen brugdek
6. Aanbrengen onderlaag
7. Aanbrengen toplaag
8. Aanbrengen belijning
9. Demob. tent
10. Terugbrengen geleiderail

Waarom geen rijstrook open?

- Veiligheid tijdens het werk
- Levensduur aan te brengen constructie
- Korte doorlooptijd



24/7 werken waar mogelijk



Maatregelen om de hinder te beperken

- 1) Communicatie
- 2) Verkeersmanagement
- 3) Mobiliteitsmanagement

Hartelbrug en Zoetwaterkanaalbrug
gaan niet open voor scheepvaart





Communicatieplan en -kalender ✓

Februari	Maart	April/mei
Omleidingskaart ✓	-> Maatregelen-pakket ZH Bereikbaar	Artikel voor algemene media en media stakeholders, projectpagina e.d.
Projectflyer ✓	Advertorials /advertenties	Flyeren
Werkkalender ✓	Animatie	
Inrichten projectpagina	Digitale borden langs de weg	Social media content
Persgesprek en persbericht	Persgesprek / interview op locatie	Bestuurlijke moment op bouwplaats
Opstellen Q&A	Bewonersbrief over geluidsoverlast	Video-opnames
Vooraankondigingen	Persbericht	Mediamoment op bouwplaats
Gesprekken / bijeenkomsten	Routeadvies (oa DRIPS)	Duo interview
Info-pakket (digitale toolkit)		
Digitale nieuwsbrief	Digitale nieuwsbrief	Digitale nieuwsbrief
Flyer, brief naar specifieke doelgroepen (witte kolom, land-bouwverkeer, werkgevers)		



Verkeersmanagement

- (Vracht)verkeer
- Hulpdiensten
- Land- en bouwverkeer
- Regelscenario's






Mobiliteitsmanagement vanuit ZHB

Maatregelen vanuit de Renovatie BBB versneld inzetten:

- Parkeerhub Hoogvliet
- E-bike / speedpedelec uitprobeerpool, fietspromotiedag, leasefiets bedrijven
- Ov-probeerpas
- Lancering slim reizen app
- In-car / on-trip informatie (bijv. in samenwerking met Flitsmeister)
- Monitoringsplan/analyse verkeerssituatie voor tijdens en na stremming door ZHB
- Promoteams met flyeracties
- Billboards plaatsen langs de weg



Spitsmijden



Thuiswerken



Fietsen of
lopen



Metro



Vragen

